



# 新鹿島市民会館新築工事 進捗状況（R4年1月分）



新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。


工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## ＜進捗状況＞

1月は電気を引き込むための地中配管路を造る作業や、建物周囲に足場を建てる作業、1階の躯体のための鉄筋を配筋する作業を行いました。1月半ばには現場において、統括監理者である古谷氏から市長への進捗状況と外装の仕上げの仕様説明を行いました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、月末に1週間程度の中断を挟みましたが、2月も引き続き上部躯体を造る作業を進めていきます。

### 工事状況の様子

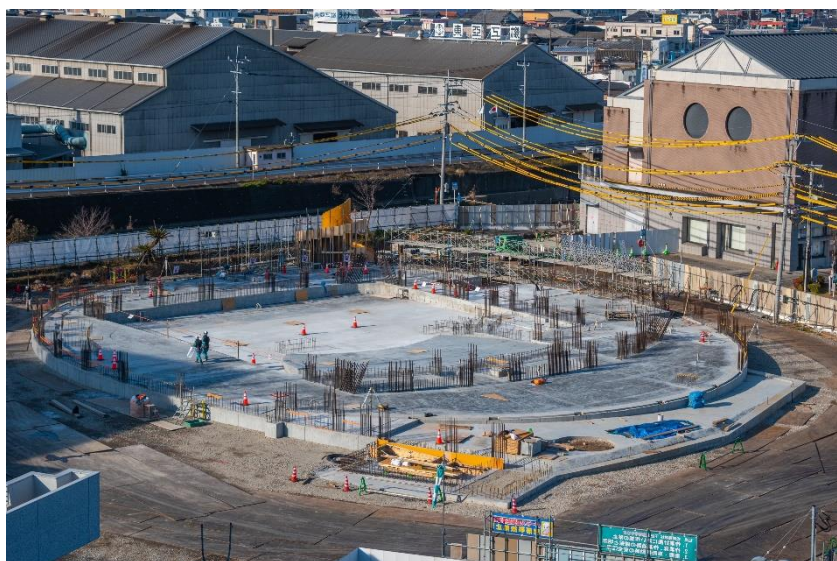

建物の外形に合わせて周囲に足場を建てています。  
足場の作業の進捗にあわせ、柱や壁の鉄筋を配筋しています。








建物周囲では新世紀センター側から電気を引き込むための電気配管路の埋設作業を行いました。

統括監理者である古谷氏から外装の仕上げの仕様を3D 画像や現地にて説明を受けました。



市長にも実際に建設現場を訪れてもらい、施設の大きさや雰囲気を体感してもらいました。

