



新鹿島市民会館新築工事 進捗状況 (R3年12月分)




新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。

工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

《進捗状況》

12月は1階の床を造る作業を行いました。鉄筋を配筋した床面にコンクリートを流し込み、平滑に仕上げていきます。平滑にする作業には左官屋さんが専用の機械を使います。年が明けて1月からは、周囲に足場を建てて本格的に1階の柱や壁を造る作業を行う予定としています。

工事状況の様子

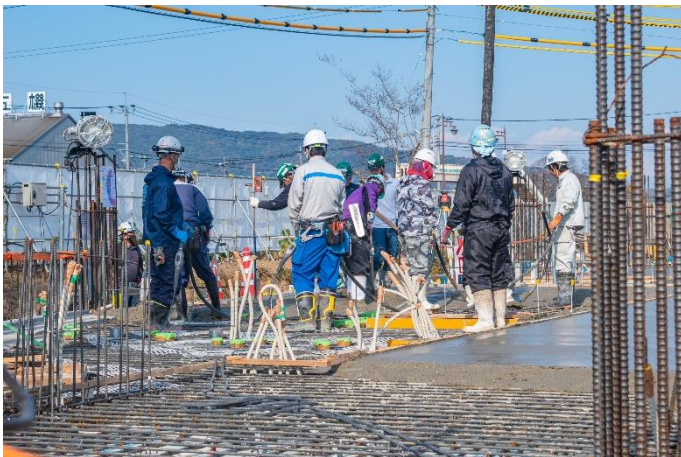

←床コンクリートの打設中の様子



床コンクリートの打設後の様子→



←打設後の左官仕上げの様子



床コンクリート作業の完了の様子→

