



# 新鹿島市民会館新築工事 進捗状況 (R3年6月分)



新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。

工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

## 《進捗状況》

6月は基礎を造る作業に取り掛かるための準備作業として、土留めを支える H 形鋼を打ち込む作業や、土砂を掘る作業を行いました。7月は基礎を支える杭(地盤改良杭)を築造する作業を主に行います。


### 土留め作業の流れ



①

①

H 形鋼を打込みやすくするために、専用の機械で先に掘削をして土を柔らかくします。

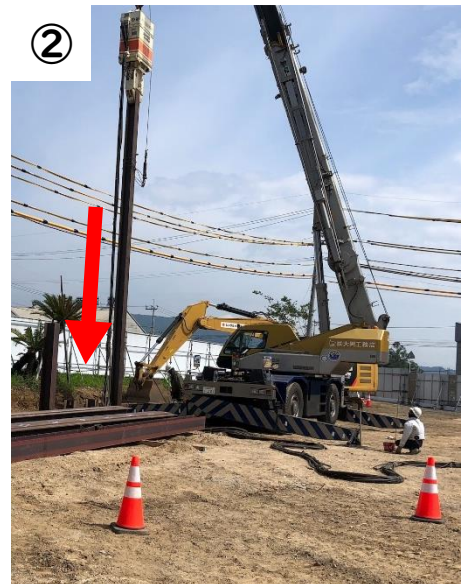

②

②

25t クレーンで専用の機械(バイブロハンマー)を取り付けて、先に柔らかくした穴に H 形鋼を打込みます。



③

③バックホーで土を掘ります。



④


④最後に杉の板を H 形鋼の間に差し込んで土が崩れないようにします。

## 《工事のお知らせ》

工事に伴い7月10日(土)から10月9日(土)の間、下図の部分を通り止めといたします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

中川沿いの道路は歩行者・自転車のみ  
使用できます。

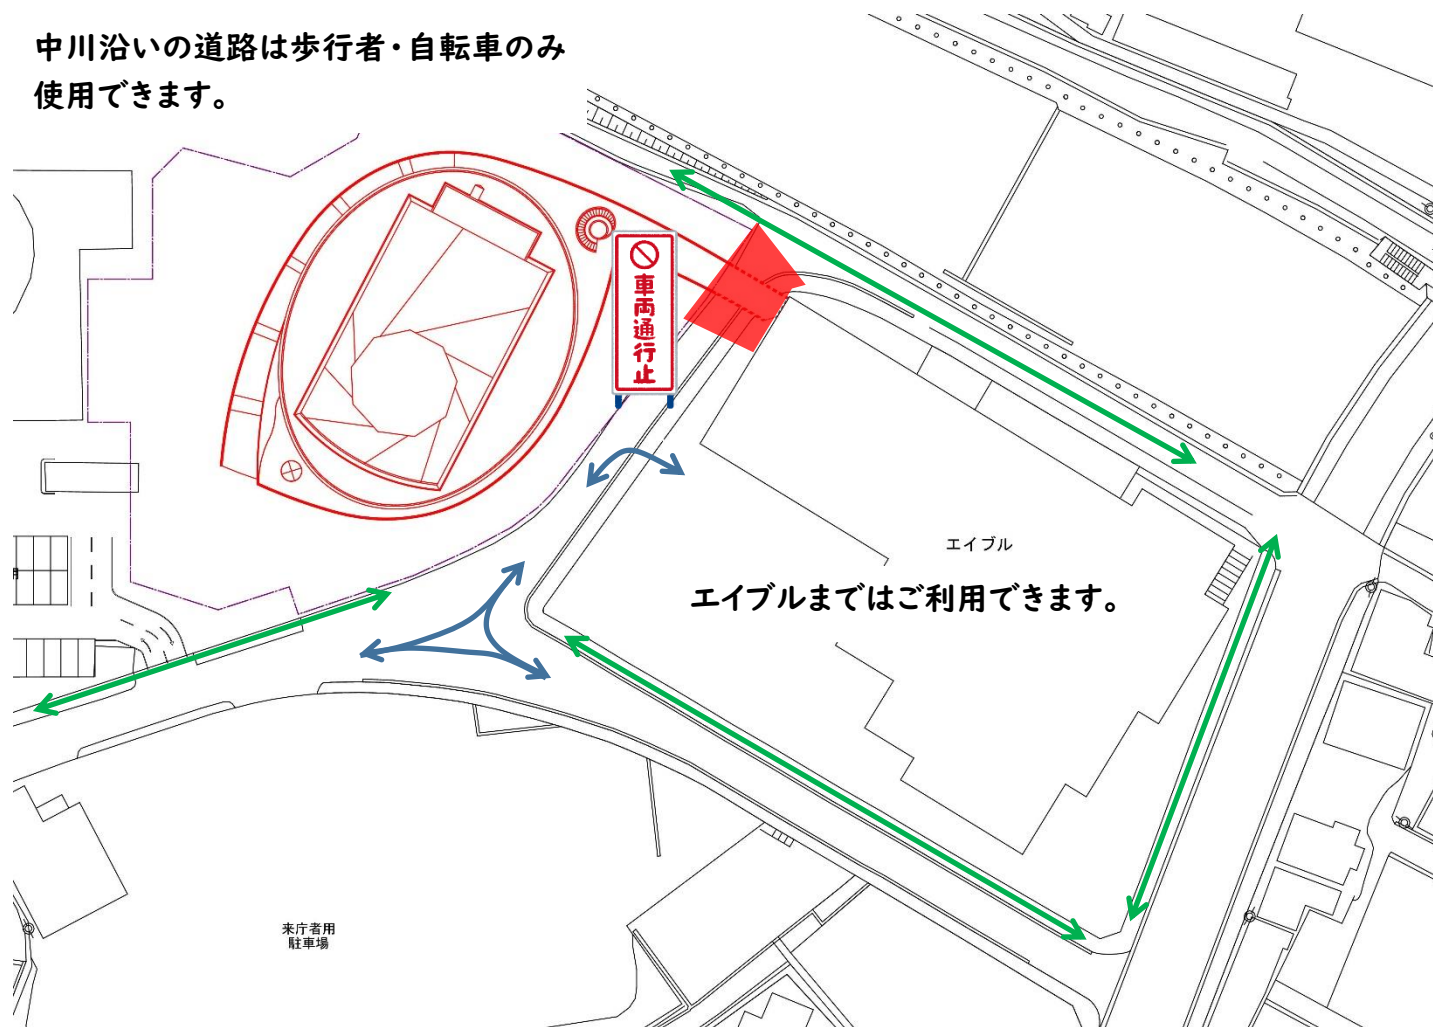

鹿島市 総務部  
中川エリア整備推進室  
電話:0954-63-2111
