



新鹿島市民会館新築工事 進捗状況 (R3年8月分)



新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。
工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

《進捗状況》

8月は先月に引き続き、地盤をより強くする地盤改良の作業と整地作業を行いました。

1つの地盤改良体の大きさは直径1m程度で、これを連続させることで基礎ができる場所の地盤を強くします。今回の工事では全体で700体程度の改良体を構築しています。

9月はいよいよ基礎を造る作業に取り掛かります。

工事状況の様子



全体全景

地盤改良作業完了後の整地作業を行っている。

築造完了した地盤改良体

直径は1m程度。何個も連なり基礎を支える。



整地を行い、今後の作業がしやすいように地盤表面をコンクリートで覆う。(通称:捨てコン) 基礎はこの上で造られる。




《工事のお知らせ》

工事に伴い7月10日(土)から10月9日(土)の間、下図の部分を通り止めとしています。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

中川沿いの道路は歩行者・自転車のみ
使用できます。

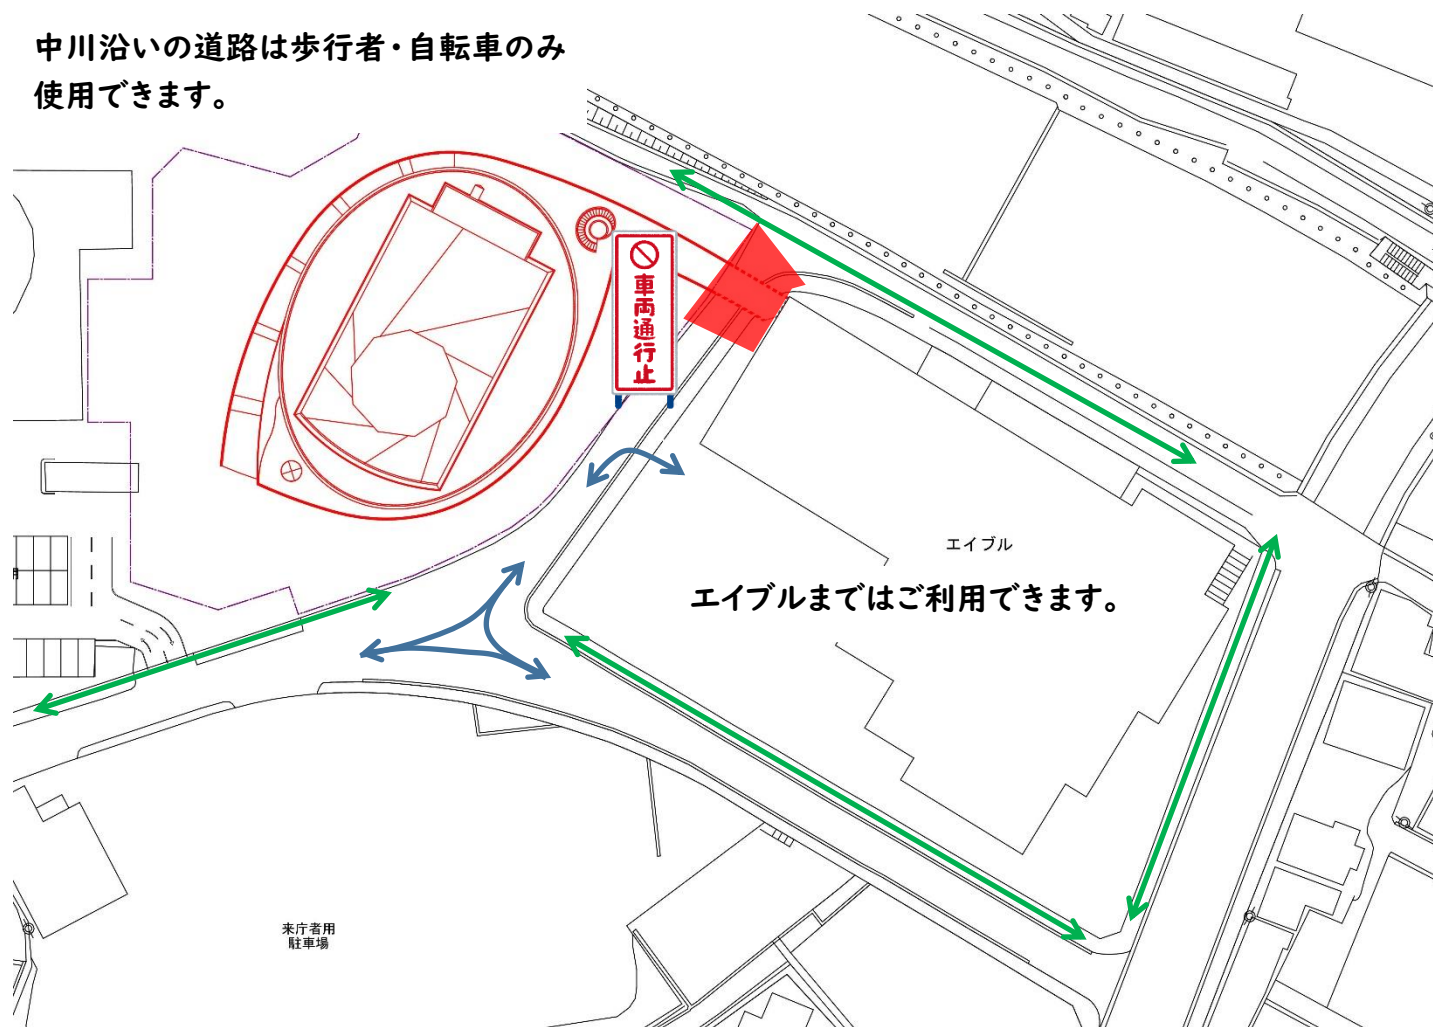

鹿島市 総務部
中川エリア整備推進室
電話:0954-63-2111
