



新鹿島市民会館新築工事 進捗状況(R3年9月分)



新鹿島市民会館新築工事の進捗状況等についてお知らせをします。

工事期間中は市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

《進捗状況》

9月は建物の基礎を造る作業を行いました。

基礎足場と呼ばれる仮設物を設置し、鉄筋や型枠を図面通りに組み立てて、コンクリートを打設していく作業となります。今回は一定の面積毎の工区に分けて作業を進めており、鉄筋→型枠→コンクリート打設という一連の流れで基礎を造っています。

10月も引き続き基礎を造る作業を進めていきます。

工事状況の様子




R3年5月

工事着工から5か月が経過し、更地だった敷地に新市民会館の形が分かるようになってきました。



R3年9月

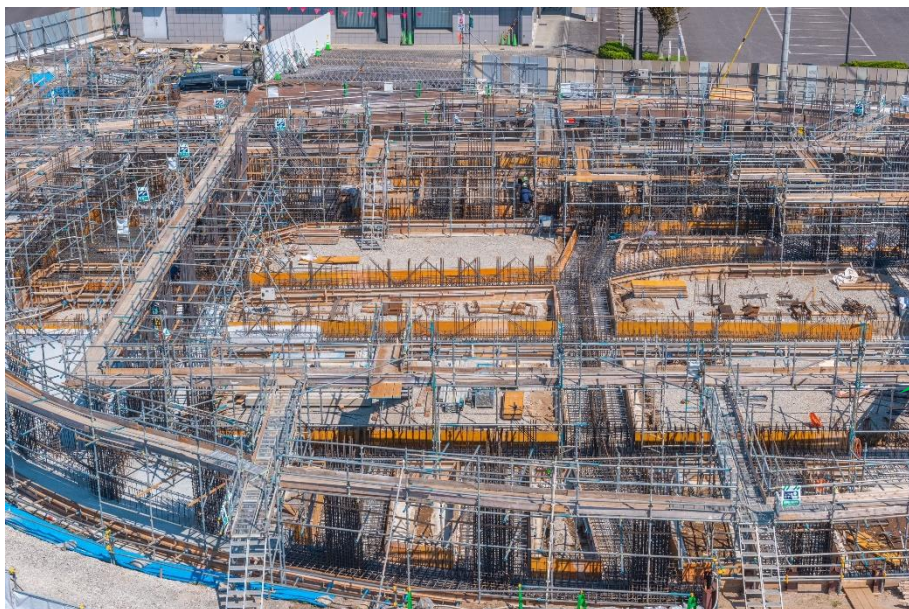

鉄筋を組み立て、その後に型枠を組み立てていきます。
オレンジ色に見えるのが型枠で
その中に鉄筋が組み立ててあります。

コンクリートを打設する前には、監理者立会いのもと、求めている性能のコンクリートができているかを確認します。



監理者の検査に合格したら、本格的にコンクリートを打設していきます。ポンプ車を使って打設する場所までコンクリートを送り込みます。



コンクリートを打設する時は多くの作業員が協力しながら打設していきます。元請け会社の作業員も円滑に作業ができるように指示や調整を行います。




《工事のお知らせ》

工事に伴い7月10日(土)から通行止めとしている新市民会館と生涯学習センターの間の道ですが、通行止めの期間を2か月間延長し12月9日(木)まで通行止めといたします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

中川沿いの道路は歩行者・自転車のみ使用できます。

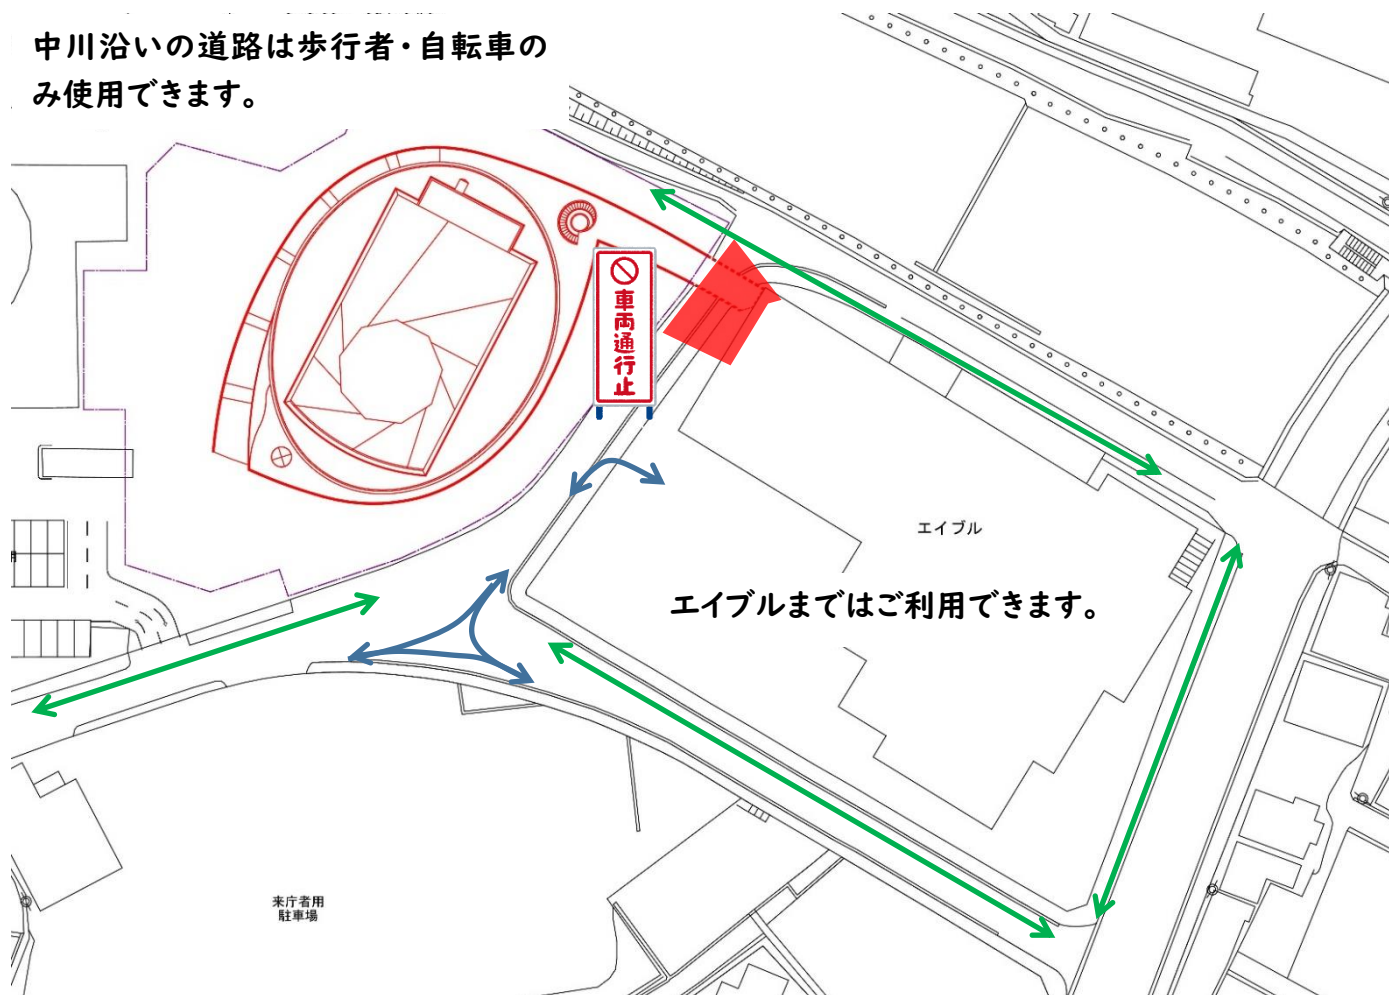

鹿島市 総務部
中川エリア整備推進室
電話:0954-63-2111
